

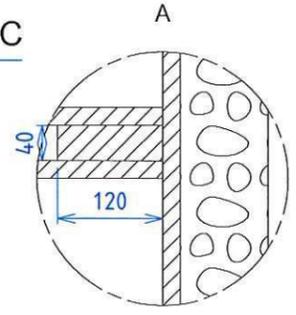
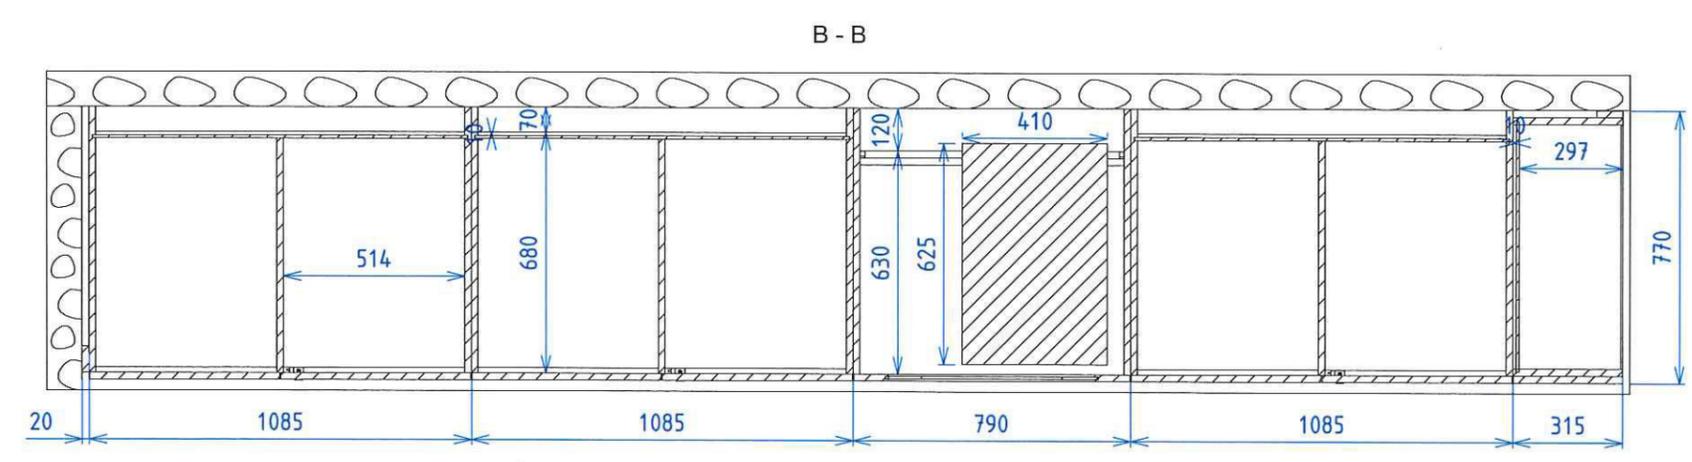
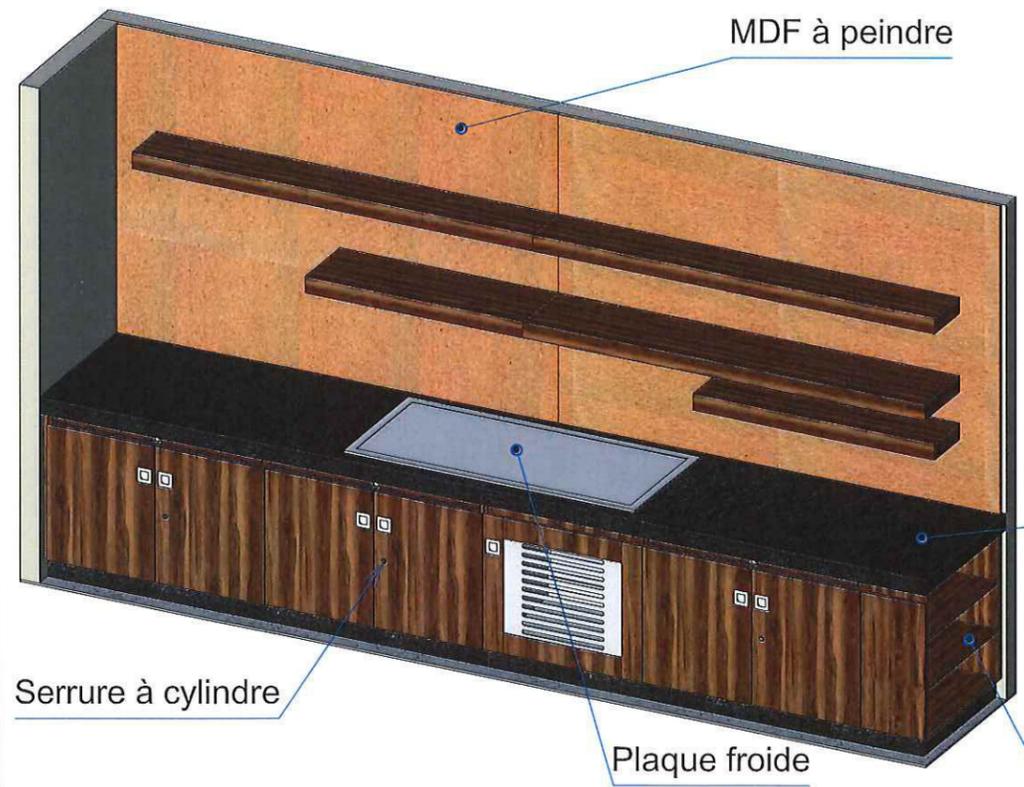


MULTIPLIS

1/20	SCHALCK MENUISERIE & AGENCEMENT 	DESSINATEUR Ludovic T.	P	
		08/03/2016		
A3	LE LODGE			
	CLAUSTRAS 630_2378			1/1

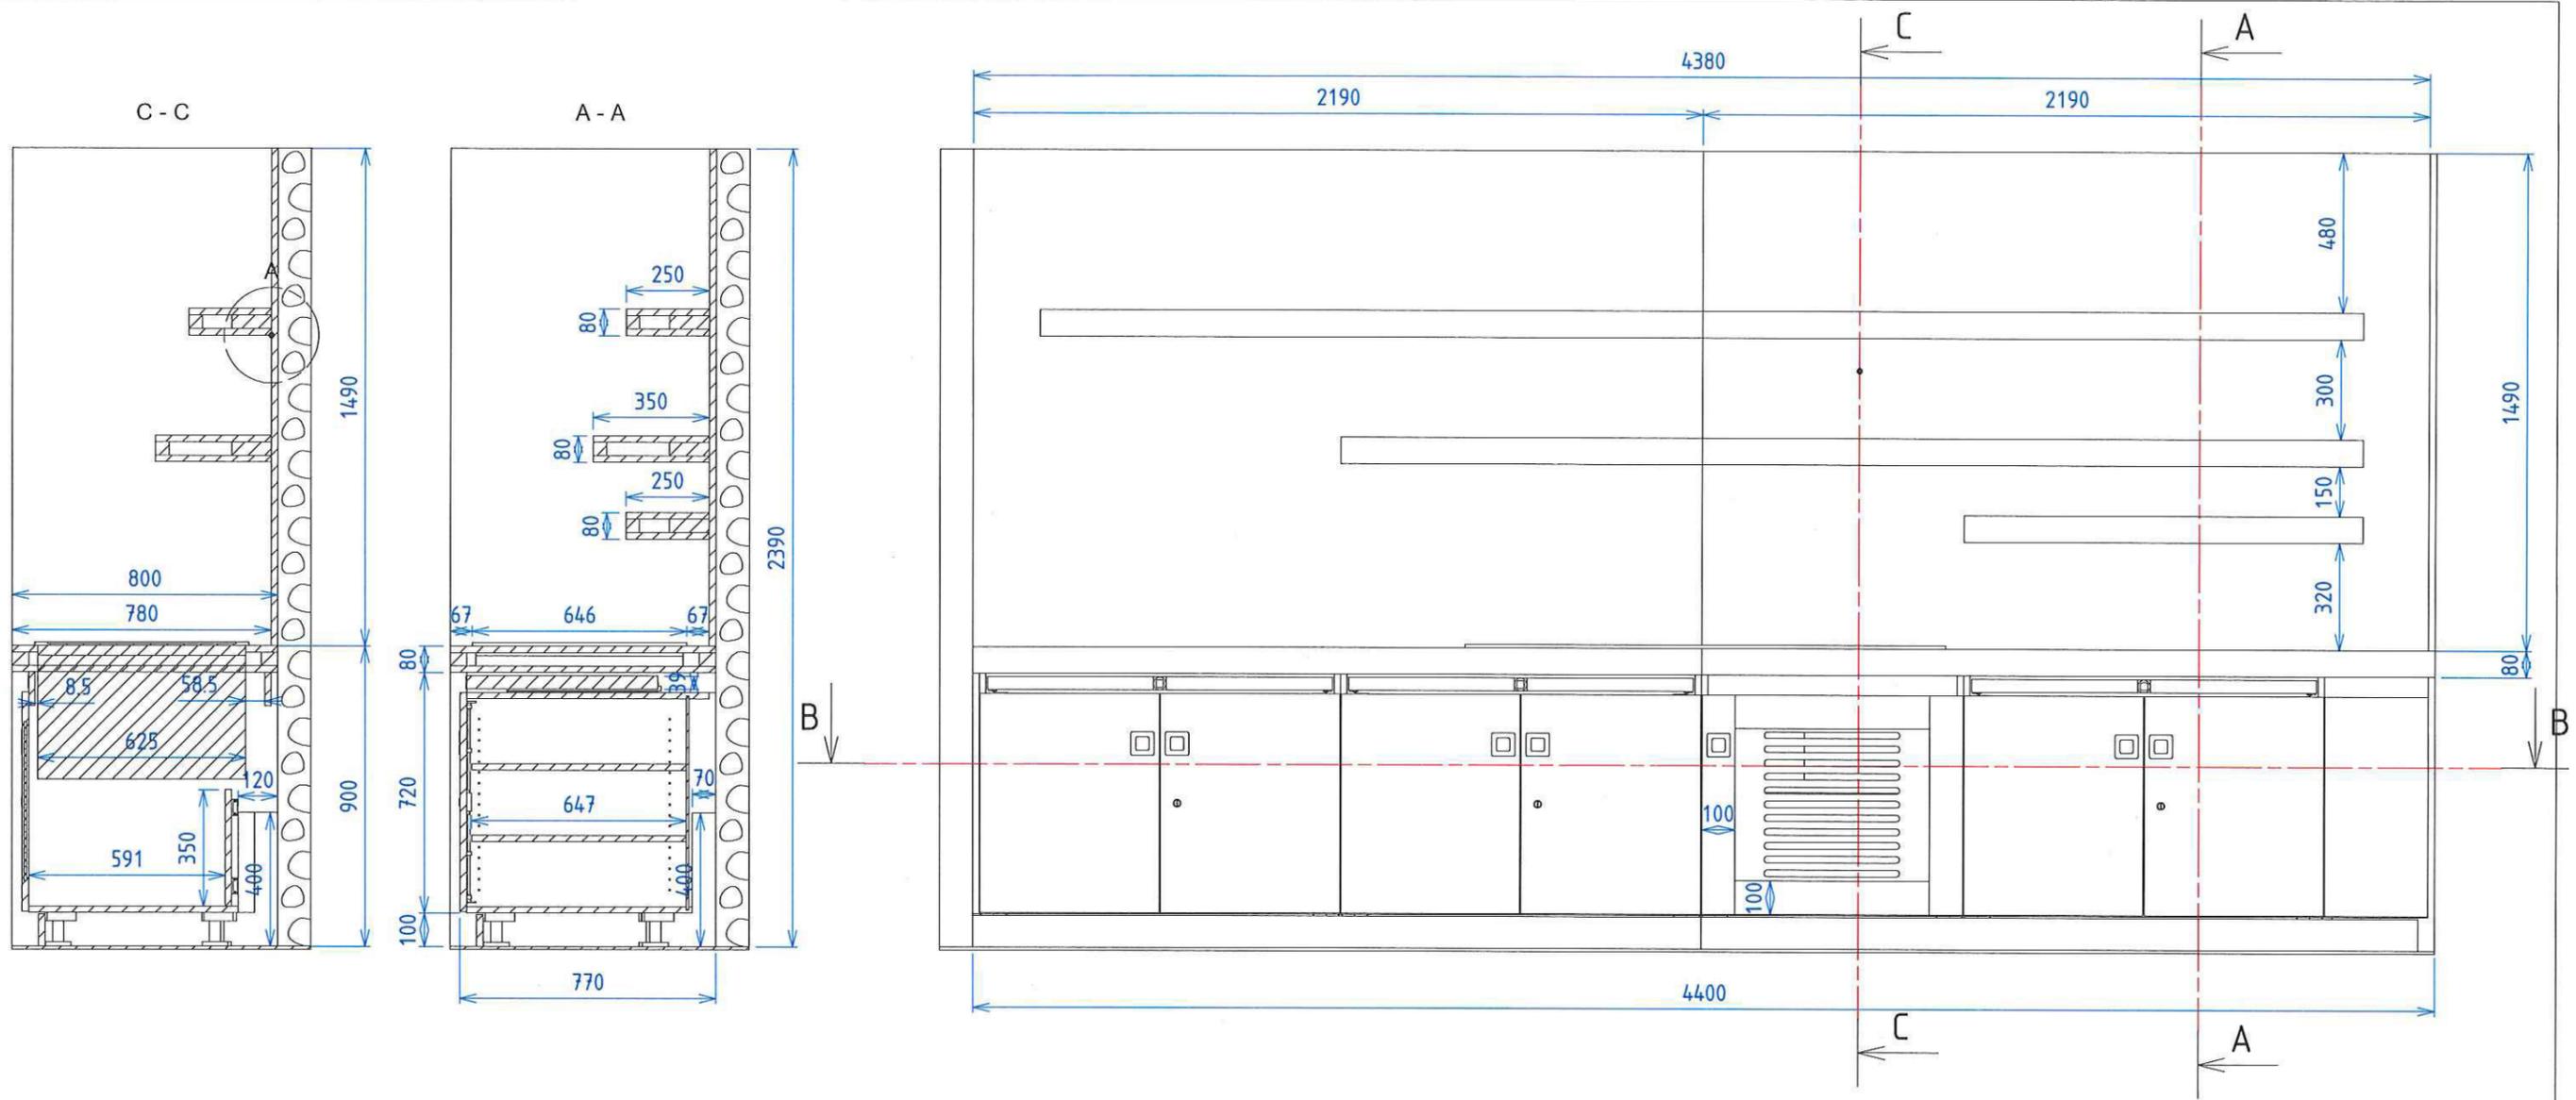

1/25	 SCHALCK MENUISERIE & AGENCEMENT	DESSINATEUR		
		Thomas A.	P	
		22/02/2016		
	LODGE			
	Comptoir petit déjeuner			
A3				1/1

APPEL D'OFFRE	SAS STRASBOURG LODGE Immeuble rue Paul Eluard 67200 STRASBOURG
Edité à NIEDERMODERN, le 30 juillet 2018	
Référence : 17B-0712 Conçu le : 23/03/18	
Objet du devis	
LE LODGE HOTEL - LOT MOBILIER RESTAURANT ET EQUIPEMENT DES CHAMBRES - DECOMPTE DEFINITIF ET REEL	

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
LOT MOBILIER RESTAURANT					
COMPTOIR PETIT-DEJEUNER					
Confection, fourniture et pose de meuble petit déjeuner, façade avec ouverture à la française en panneaux stratifiés dans la gamme Egger Poirier H3114 avec serrure à clefs. Dimension du mobilier : Lt4180 x Ht900 x Pt700mm					
1	La façade	U	1,0000		
2	Une étagère sur console et un panneau pour carreler la crédence	En s	1,0000		
3	Confection, fourniture et pose des caissons intérieurs en panneaux mélaminés avec étagères et fond. L'ensemble	En s	1,0000		
4	Confection, fourniture et pose d'un plan de travail stratifié par nos soins N005 Noir ROC Confection, fourniture et pose de comptoir d'accueil en panneaux stratifiés dans la gamme Egger, comprenant : • Un caisson à gauche avec portillon et façade	MI	4,1800		

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
5	<ul style="list-style-type: none"> • Un plan de travail PMR rétractable • Deux caissons avec deux tiroirs chacun et un caisson ouvert avec un tiroir coulissant, plan de travail avec deux réservations pour ordinateur, tablette de bar, façade avant en panneaux cuir <p>Dimension de l'ensemble : Lt 4340 x Ht 1100 x Pt 900mm</p> <p>L'ensemble</p> <p>Confection, fourniture et pose de façade de bar en panneaux stratifiés dans la gamme Egger Poirier H3114, insert cuir selon plans transmis par le client incluant :</p> <p>plan de travail stratifié N005 Noir ROC</p> <ul style="list-style-type: none"> • emplacement pour lave-verre (MB2) <p>emplacement pour réfrigérateur</p> <ul style="list-style-type: none"> • emplacement pour évier et machine à glaçons <p>Dimension de la façade avant : Lt990 + 1780 + 1690 x Pt950 x Ht920 et 1100mm</p>	En s	1,0000		
6	<p>En ml</p> <p>Confection, fourniture et pose de meuble arrière bar avec retour et tablette HAND.</p> <p>Façade en panneaux stratifiés dans la gamme Egger et intérieur en panneaux mélaminé blanc et plan de travail compris.</p> <p>Dimension du retour : Lt1900 x Ht800 x 100mm d'épaisseur</p> <p>Dimension de la façade du meuble arrière : Lt970 + 330 + 970 x Ht950 x Pt500mm</p> <p>Dimension du fond : 1.33m²</p> <p>Dimension des séparations : 2.85m²</p> <p>Dimension du plan de travail : 2.27m²</p>	MI	4,4600		
7	<p>L'ensemble</p> <p>Confection, fourniture et pose de meuble haut arrière comptoir selon plans d'architecte, en panneaux stratifié dans la gamme Egger.</p> <p>Dimension : Lt2630 x Ht700 et 1050 x PT400mm</p>	En s	1,0000		

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
8	Un ensemble Confection, fourniture et pose de claustras selon plans d'architecte en panneaux MDF d'une épaisseur de 19mm brute avec défonçage et cache de section 50 x 60 en hêtre multipli 40mm d'épaisseur brossé avec parclose, le cadre sera en finition vernis mat.	En s	1,0000		
9	Dimension de l'ensemble : Lt625 x Ht2500 x 19 et 50mm d'épaisseur Support inox haut et bas fixe hauteur de vie 100mm	Pc e	18,0000		
10	La pièce REMISE DE 5%	Pc e	72,0000		
11	L'ensemble Sous-total	En s	-1,0000		
LOT EQUIPEMENT DES CHAMBRES					
12	Un ensemble Confection, fourniture et pose d'une tête de lit en panneaux replaqué chêne, y compris finition brossé et vernis incolore selon plan vu ce jour. " <i>hors capitonnage</i> " Dimension : 1200 x 3600 x 80mm	En s	34,0000		
13	Sur mesure selon chaque chambre Confection, fourniture et pose de chevet en panneaux stratifiés au choix de 40mm d'épaisseur, y compris support à valise selon plan vu ce jour.	En s	23,0000		
14	Un ensemble Confection, fourniture et pose d'un bureau en stratifié comprenant un meuble bas à une porte, une étagère et d'un dessus.	En s	57,0000		

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
15	<p>Dimension : 1350 x 600 x 750mm</p> <p>Un ensemble</p> <p>Confection, fourniture et pose d'une armoire de rangement avec porte battante, rayonnage et tringle de penderies, l'ensemble en stratifié et replaqué chêne avec finition brossée et vernis incolore, selon plan vu ce jour.</p> <p>Dimension : 2500 x 600 x 600mm</p>	En s	42,0000		
16	<p>Chambres : 102 à 109 + 202 à 209 + 302 à 309 + 402 à 409 + 505 à 506</p> <p>Un ensemble</p> <p>Confection, fourniture et pose de placard encastré entre mur sur mesure, façade replaqué chêne brossé et intérieur en panneaux mélaminés blancs</p> <p>Dimensions pour les chambres : 110-211-311-312-411-412-502</p> <p>Lt de 795 à 830mm x Pt600mm x Ht 2500mm x + tringle et étagères vu avec le client</p>	En s	34,0000		
17	<p>La pièce</p> <p>Dimensions pour les chambres : 112-212-503-504</p> <p>Lt 1200mm x Pt600mm x Ht 2500mm + tringle et étagères vu avec le client</p>	Pc e	7,0000		
18	<p>La pièce</p> <p>Confection, fourniture et pose de placard encastré entre mur sur mesure, façade replaqué chêne brossé et intérieur en panneaux mélaminés blancs, avec vue sur les deux côtés</p> <p>Concerne les chambres : 101-201-213-301-313-401-413-501</p> <p>Dimensions : Lt1000 x Pt600 x Ht2500mm</p>	Pc e	4,0000		
19	<p>La pièce</p> <p>Confection, fourniture et pose de placard encastré entre mur sur mesure, façade replaqué chêne brossé et intérieur en panneaux mélaminés blancs, avec vue sur un côté</p> <p>Concerne les chambres : 111-210-310-410</p>	Pc e	8,0000		




N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
20	Dimensions : Lt820 à 860mm x Pt600 x Ht 2500mm La pièce	Pc e	4,0000		
21	REMISE DE 5% L'ensemble	En s	-1,0000		
	Sous-total				
	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES				
	DEVIS N° 16-0388				
22	Confection, fourniture et pose de lisse mural salle restaurant en MDF M1 à peindre Dimension : Lt4228 x Ht140 x Pt100m	MI	4,2200		
23	Confection, fourniture et pose de façade de placard en MDF M1 à peindre au 5ème étage, placard à balai, serrure bouton et cylindre Dimension : Lt535 x Ht2080mm	U	1,0000		
24	Confection, fourniture et pose de façade de placard en MDF M1 à peindre au 5ème étage Ei30 fabrication dans nos ateliers Dimension : Lt1697 x Ht2153mm	U	1,0000		
25	Confection, fourniture et pose de façade de placard en MDF M1 à peindre au rez-de-chaussée local rangement derrière meuble petit déjeuner Ei30 fabrication dans nos ateliers Dimension : Lt 700 x Ht2150mm	U	1,0000		
26	Fourniture et pose de trappe Ei30 Dimension : 380 x 380mm	U	2,0000		
27	Dimension : 300 x 300mm	U	2,0000		
	Derrière le comptoir d'accueil				
	Confection, fourniture et pose de placard, façade en MDF M1 à peindre, caisson à l'intérieur en mélaminé blanc avec intégration de vitrage pour visualisation de l'alarme incendie				

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
28	Dimension de l'ensemble : Lt1520 x Ht2340 x Pt450mm	En s	1,0000		
29	Dimension de l'ensemble : Lt1105 x Ht2340 x Pt380mm	En s	1,0000		
30	Fourniture et pose de bloc porte Ei30 sur huisserie métallique fourni par nos soins et posé par le lot gros oeuvre, porte à peindre, y compris ferme-porte, poignée et crémone pompier Dimension : Lt930 + 530 x Ht2040mm épaisseur 200mm	U	2,0000		
31	Dimension : Lt930 x Ht2040mm épaisseur 200mm	U	2,0000		
32	Fourniture d'huisserie métallique à livrer sur site posée par le plâtrier ou maçon Dimension : 930 x 2040mm	Pc e	2,0000		
33	Dimension : 930 + 530 x 2040mm	Pc e	2,0000		
Comble attique					
34	Confection, fourniture et pose de façade de placard Kitchenette en MDF M1 à peindre, y compris serrure à bouton Dimension : Lt1550 x Ht2080mm	M²	3,2200		
35	Confection, fourniture et pose d'élément bas de cuisine en panneaux stratifiés blancs avec emplacement vide pour réfrigérateur et élément évier Dimension de l'ensemble meuble évier : Lt 980 x Ht900 x Pt650mm	Pc e	1,0000		
36	Confection, fourniture et pose d'un plan de travail en panneaux stratifiés postformés Dimension : Lt2000 x Pt650 x 40mm d'épaisseur	Pc e	2,0000		
37	Confection, fourniture et pose d'étagères murales fixées par équerres aluminium renversées, fabrication dans nos ateliers Dimension : Lt2000 x Pt350 x 40mm d'épaisseur	MI	4,0000		
38	Plus-value pour fourniture et pose de porte coulissante en applique Confection, fourniture et pose de séparations horizontales et verticales en panneaux mélaminés blancs dans les locaux "Femmes de ménage".	U	1,0000		


N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
39	4ème étage	M²	10,3000		
40	3ème étage	M²	10,3000		
41	2ème étage	M²	14,5800		
42	1er étage	M²	16,3300		
43	Rez-de-chaussée	M²	9,9700		
44	Rez-de-chaussée LOCAL WC	M2	8,9800		
45	Rez-de-chaussée CUISINE	M2	7,3500		
	Confection, fourniture et pose d'un bloc-porte Ei au niveau -2				
46	Dimension : 830 x 2040 x 120mm d'épaisseur de qualité à peindre	U	1,0000		
	Dépose et repose de placards dans l'attique, y compris fileur, plinthe et bandeaux en MDF à peindre				
47	Un ensemble	En s	1,0000		
	Confection, fourniture et pose d'une porte sur mesure au local "Ménage" de qualité à peindre sur chambranle et ébrasement				
48	Dimension : Lt500 Ht2080 x 70mm d'épaisseur	Pc e	1,0000		
49	Plus-value pour poignée fixe sur bloc porte de cave	U	5,0000		
50	Remplacement de deux poignées existantes	U	2,0000		
51	Plus-value pour tablettes supplémentaires	MI	30,0000		
	Confection, fourniture et pose d'une façade au niveau du local cuisine en panneau mélaminé blanc hydro				
52	Dimension : L 1390 x H 2390 mm	M2	3,3200		
	Plus value pour fourniture et pose de poignée de tirage sur la porte WC Handicapé				
53	La pièce	Pc e	2,0000		

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
54	Plus value pour fourniture et pose de ferme porte sur la porte du WC RDC La pièce	Pc e	2,0000		
	CHAMBRE 112				
55	Confection, fourniture et pose d'un plan de travail type bureau avec un pied en inox La pièce	Pc e	1,0000		
56	Confection, fourniture et pose d'un cadre tableau en panneau CTPL finition à peindre avec un cadre en sapin Dimension L1050 x H1750 mm	En s	6,0000		
57	Confection, fourniture et pose d'une tige en inox sous le plan vasque du sanitaire au RDC La pièce	Pc e	2,0000		
58	Remise 5%	En s	-1,0000		
	Sous-total				


Total H.T.

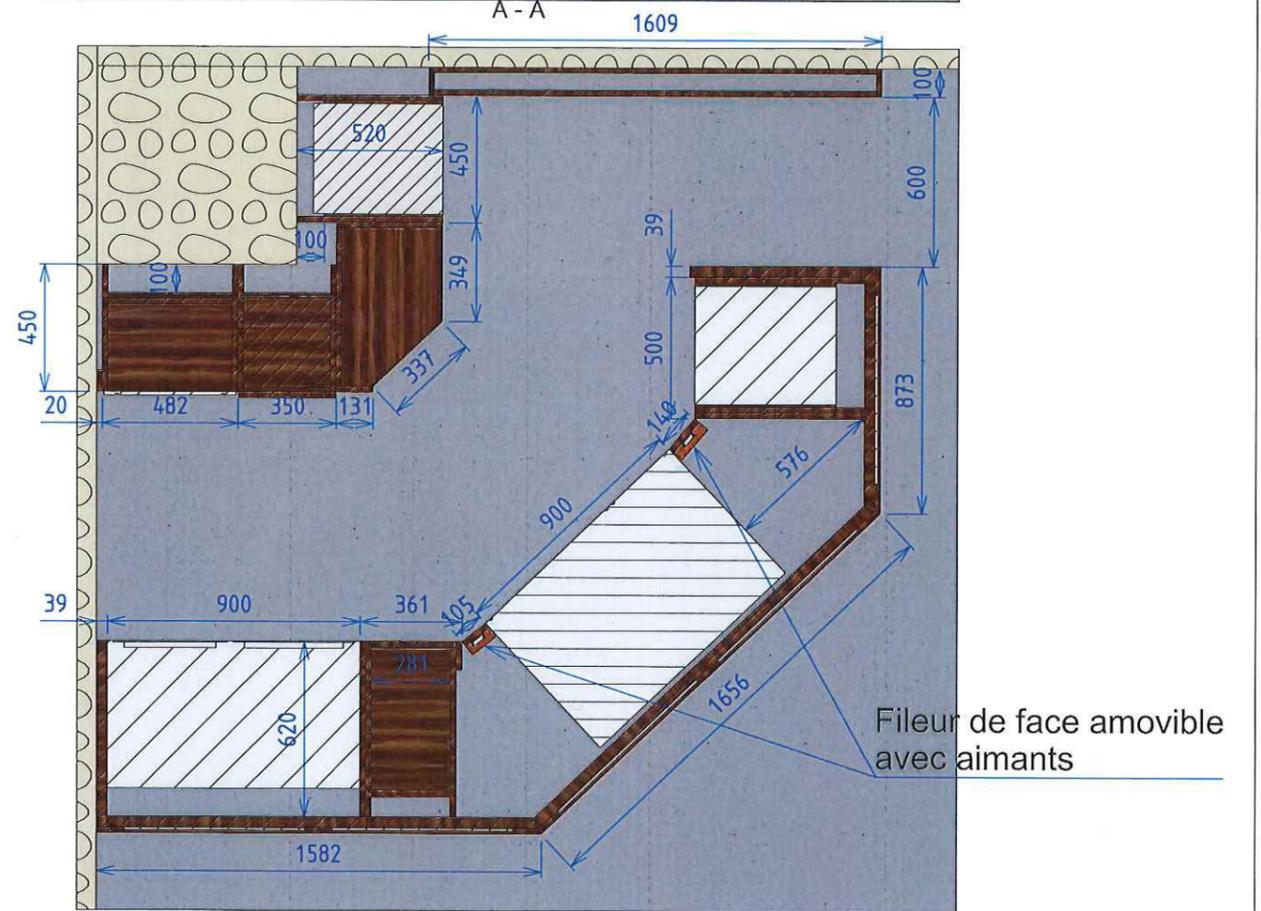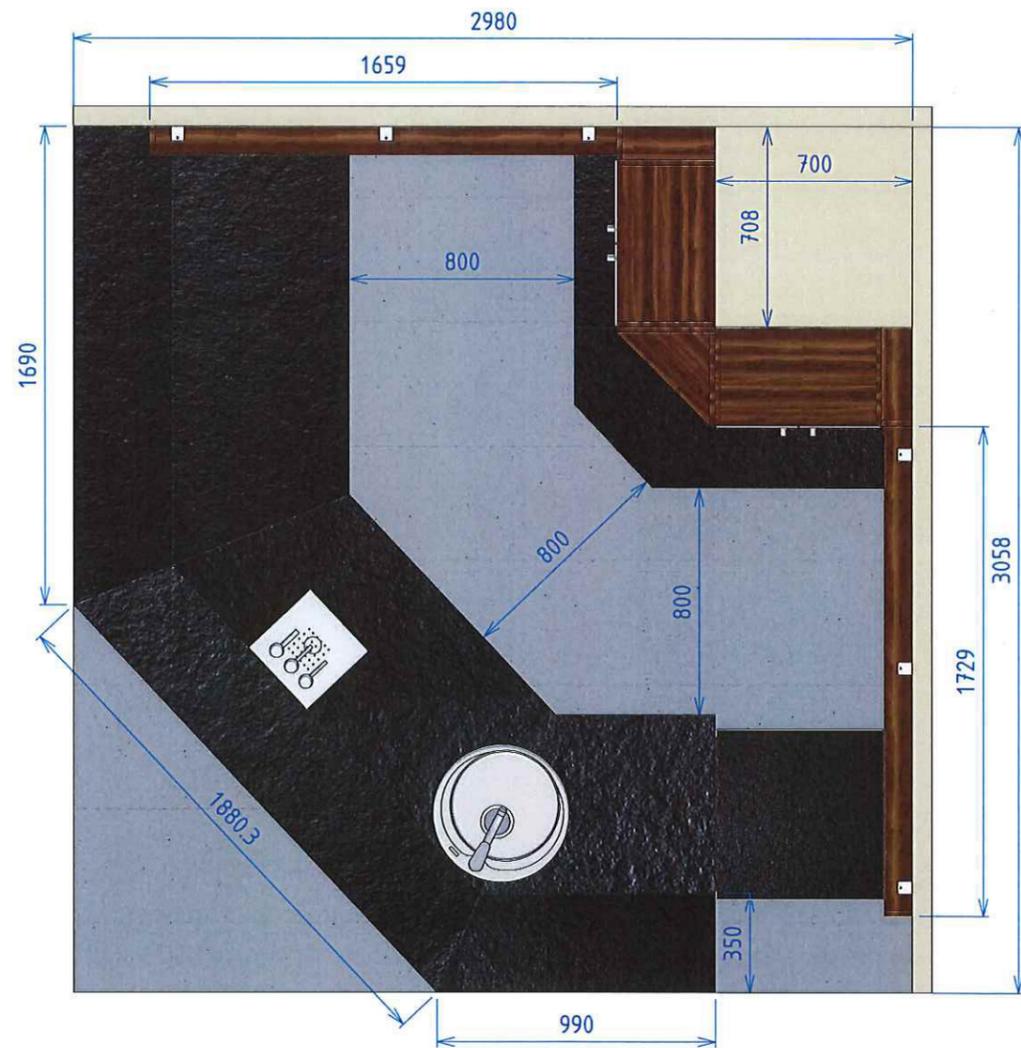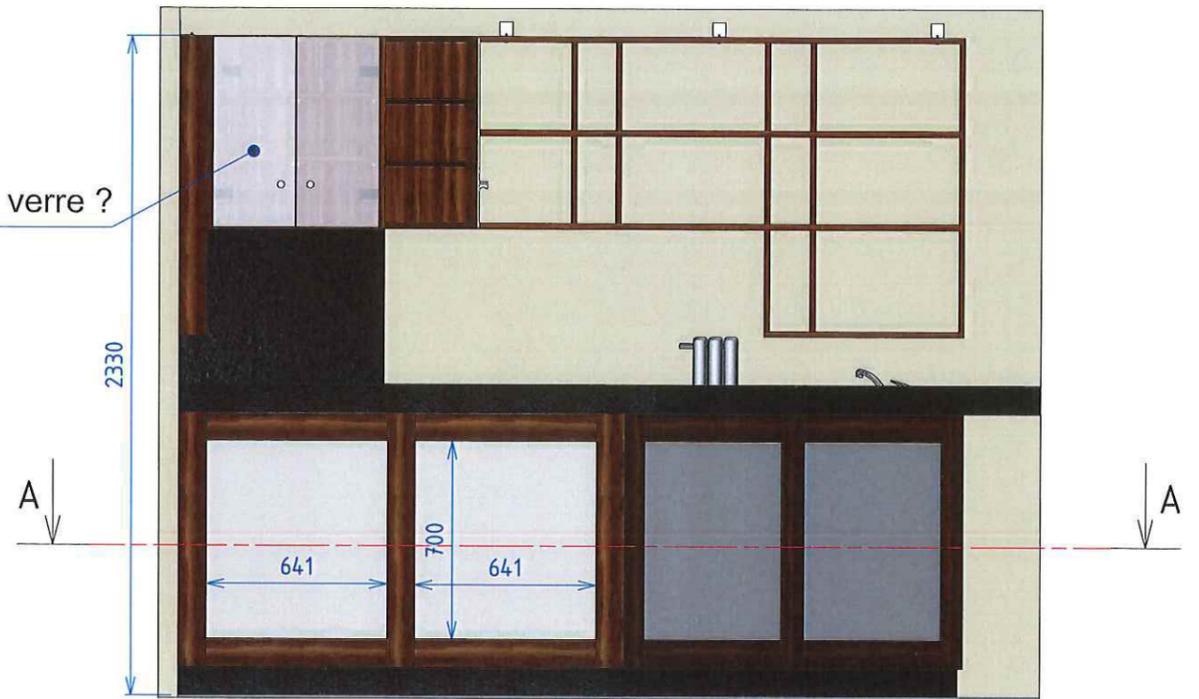

1/25		DESSINATEUR Thomas A.	P		
		02/03/2016			
	LODGE HOTEL				
A3	BAR				1/3

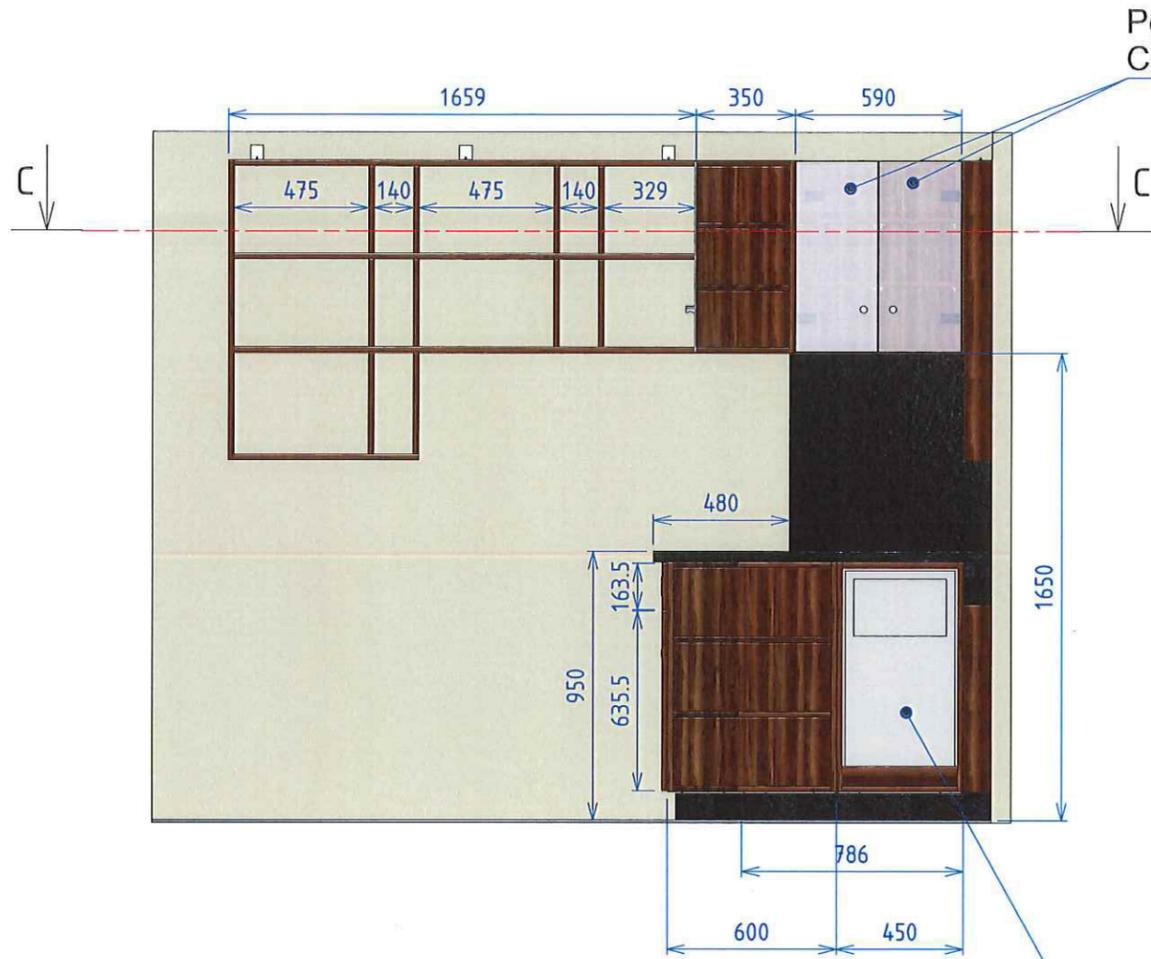

Portes vitrées
Charnière visible



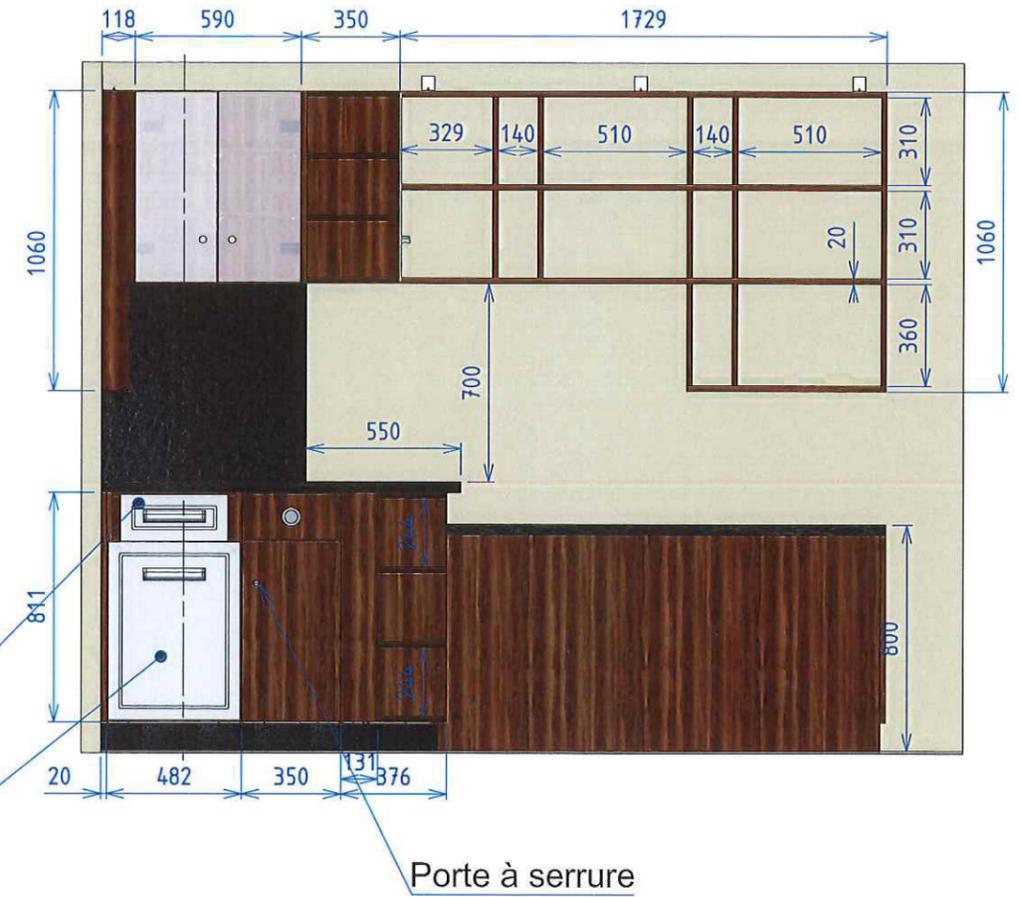


tiroir à café

Poubelle

Porte à serrure


Machine à glaçon

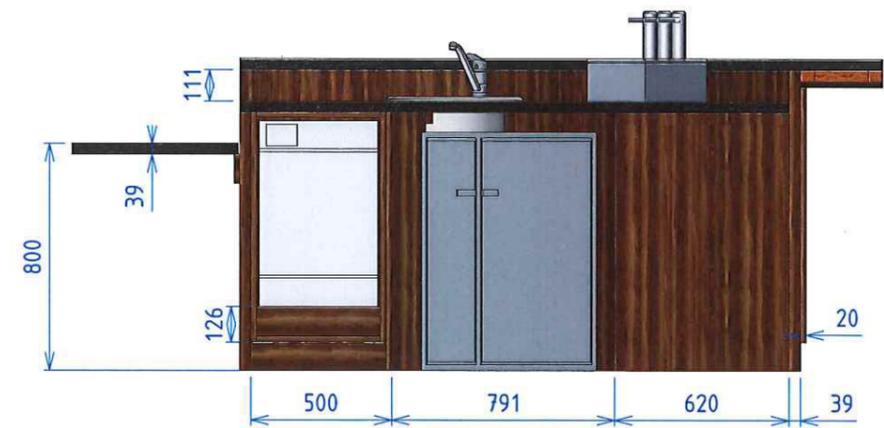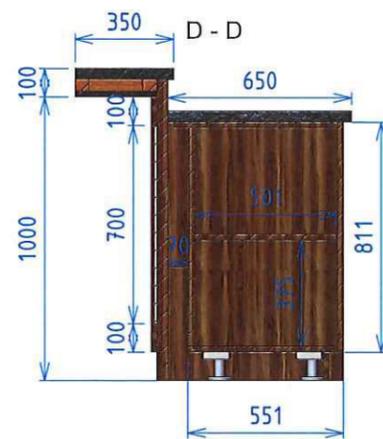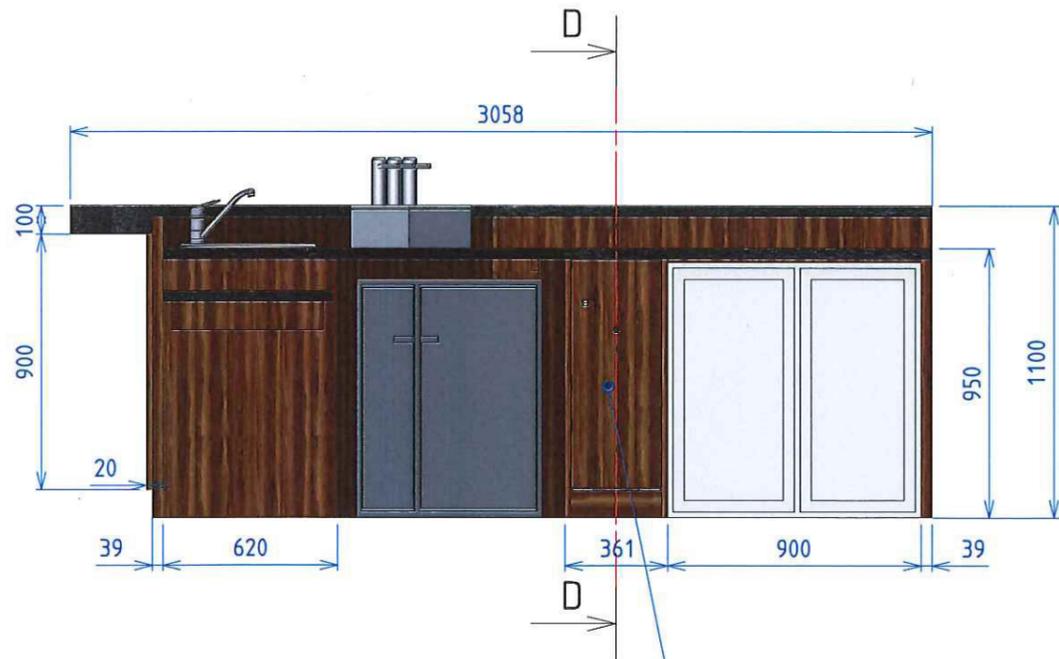

Caisson porte à serrure avec 1 étagère



Equerre de fixation

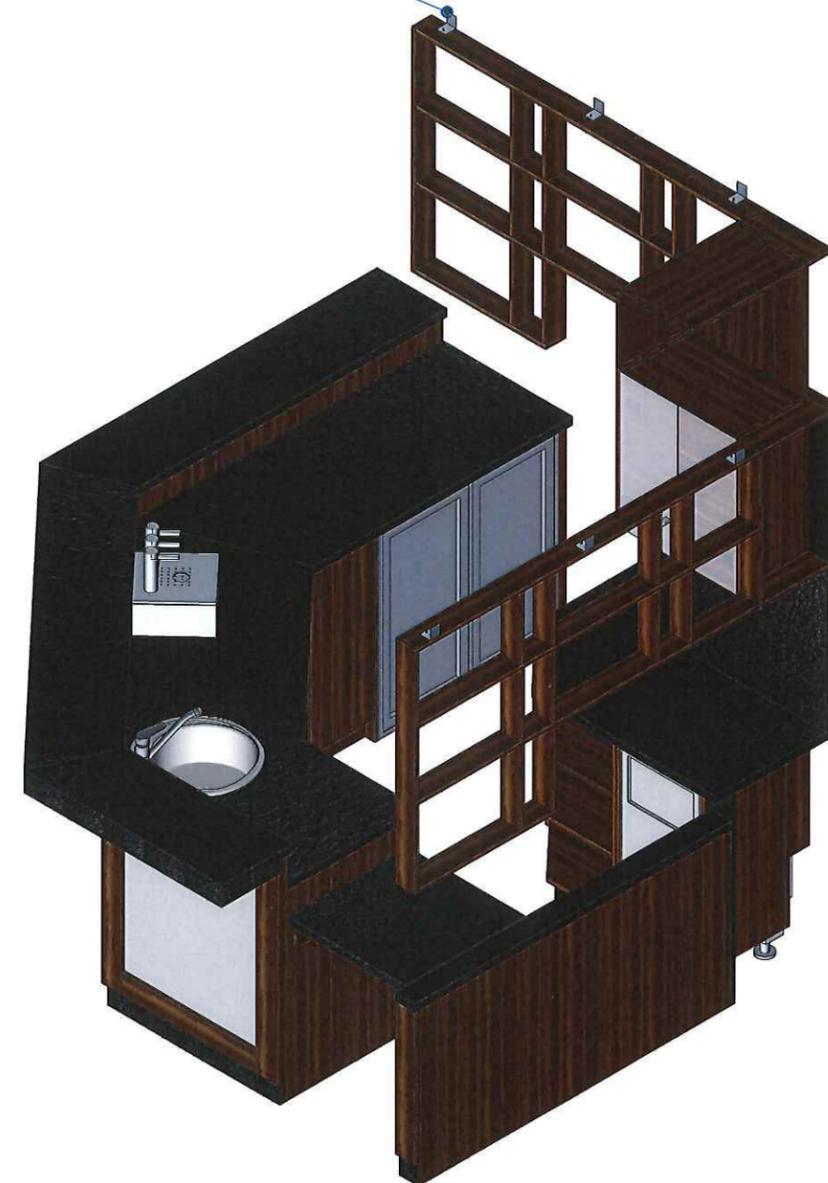

Polyrey N005 ROC Noir




Egger H3114 Poirier

Lave verre

Qualis

Frigo



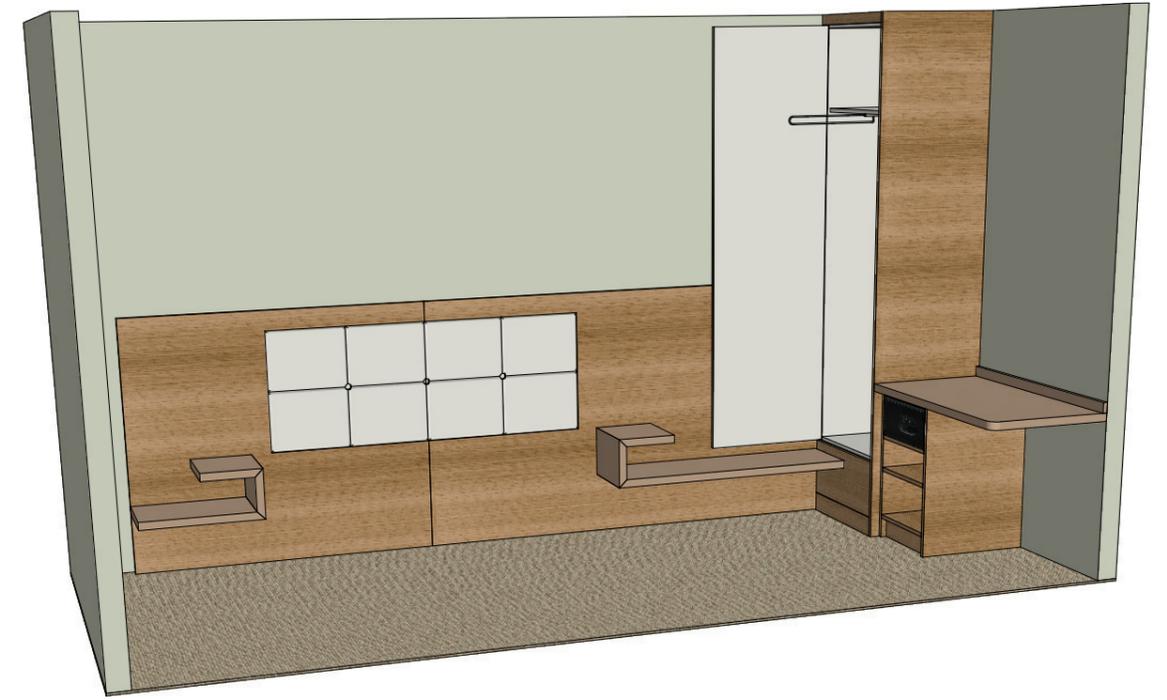



REPLAQUER CHENE NATUREL




BLANC (intérieur armoire)

1/25		DESSINATEUR Ludovic T.	P		
		30/11/2015			
	LE LODGE				
A3	IMPLANTATION CHAMBRE				
					1/3

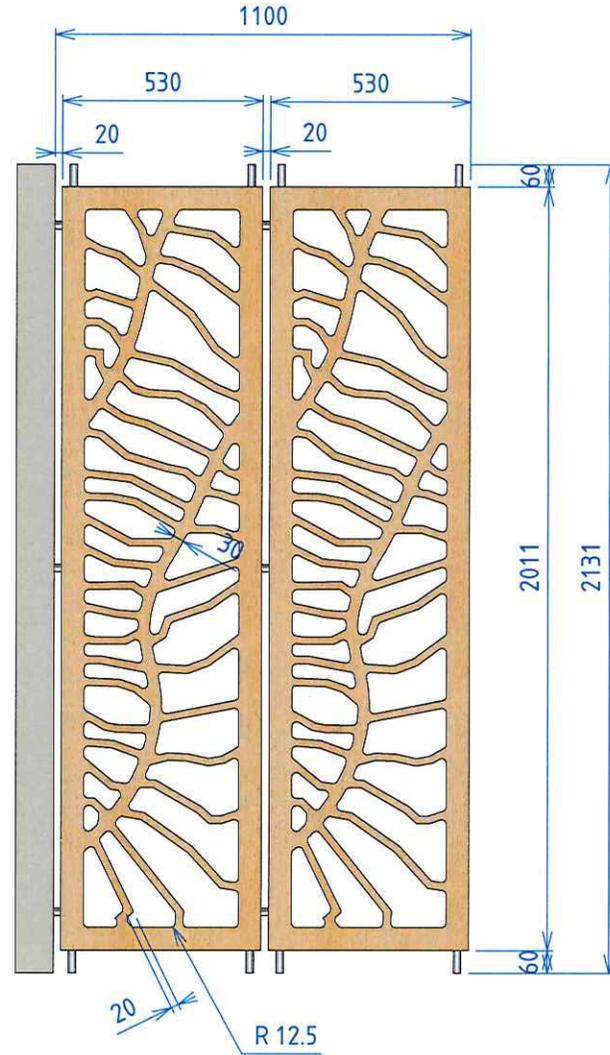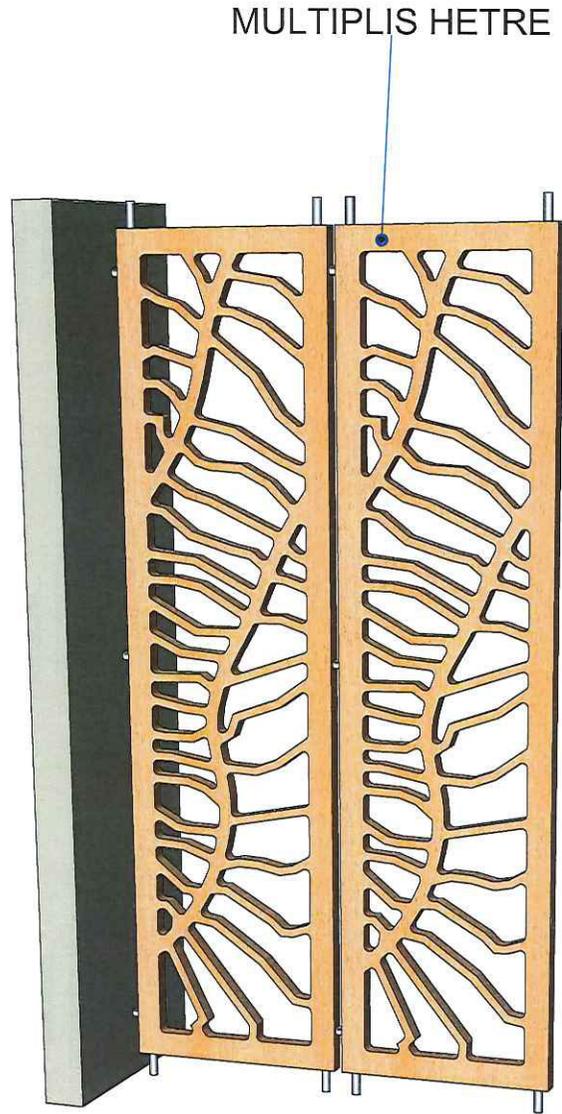

1/20	SCHALCK MENUISERIE & AGENCEMENT 	DESSINATEUR Ludovic T.	P		
		09/03/2016			
A4	LE LODGE				
	CLAUSTRAS 530_2131				1/1

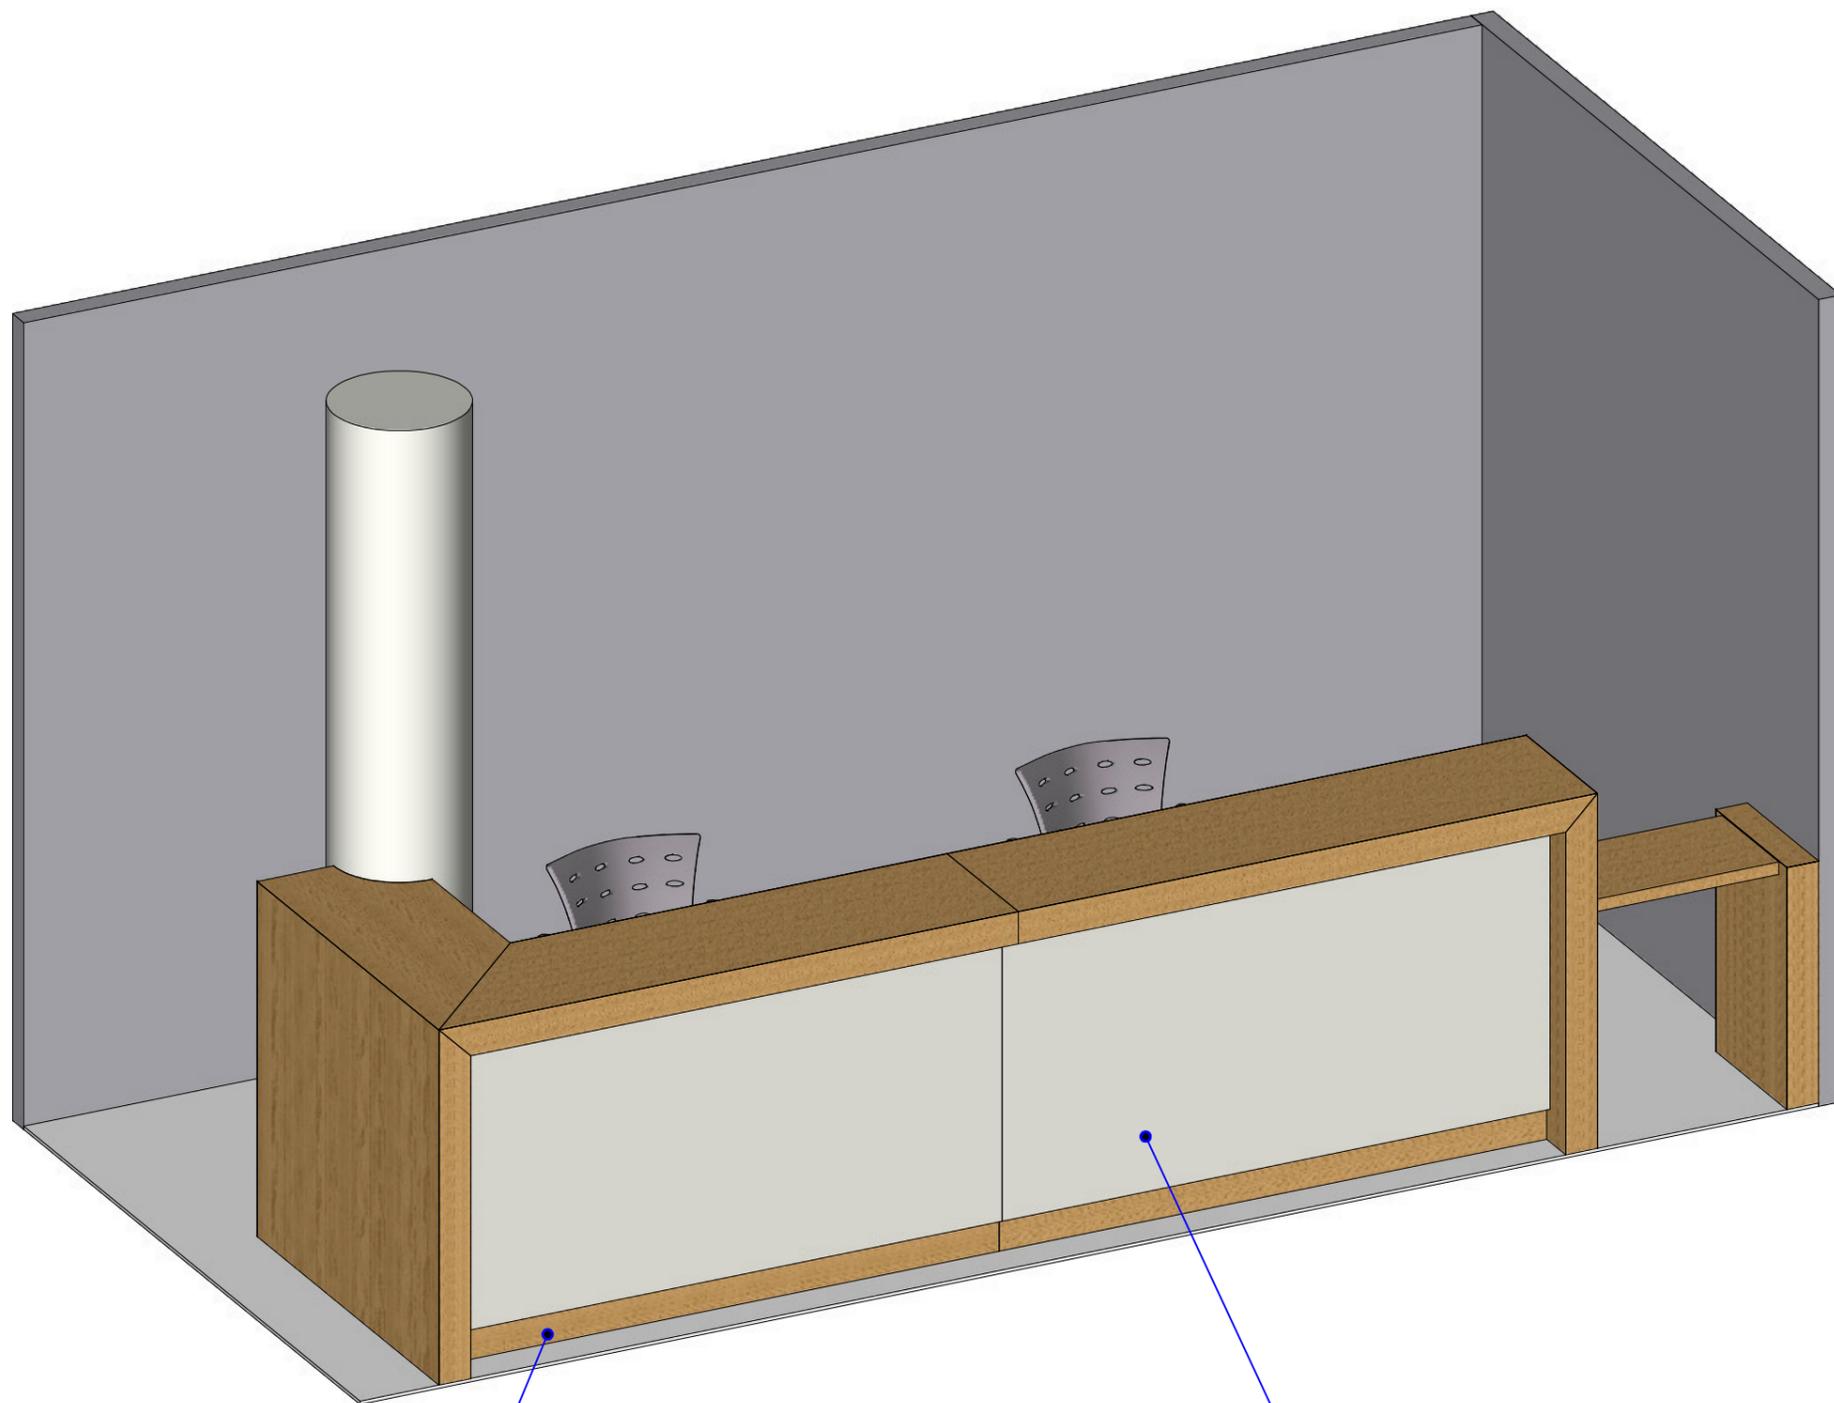

Egger H3114 Poirier

Panneau + cuir
